Cronograma AerVita

Plataforma de vigilância e predição de desastres — Recife · CESAR School, Projeto 5 · atualizado em 02/10/2026

Datas ilustrativas (fictícias), definidas para planejamento


Fases 0 e 1
Fundação e Ingestão concluídas

12 / 12
cards de bug da auditoria corrigidos

143
testes automatizados, CI verde

13/11
entrega final planejada

Visão geral

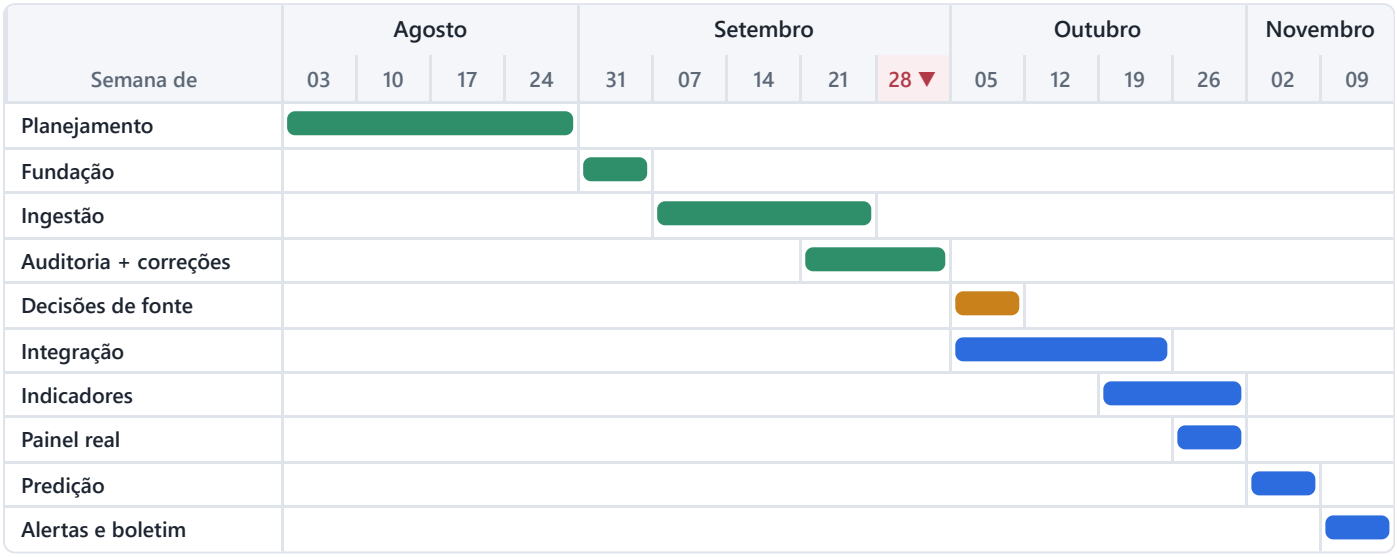

Concluído · Planejado · Bloqueante / decisão · ▼ semana atual (02/10)

Já realizado — agosto a outubro

PERÍODO	ENTREGA	SITUAÇÃO
03–07/08	Kickoff, estudo do projeto e CRISP-DM revisado	Concluído
10–14/08	Documento de arquitetura e protótipo v1 do painel	Concluído
17–21/08	21 histórias detalhadas, issues #5–#31 e Project "AerVita" no GitHub	Concluído
24–28/08	Plano de Ação, README, roteiro do kickoff, regras de uso de IA, proteção de branch e CODEOWNERS	Concluído
31/08–04/09	**Fase 0 — Fundação:** FND-01 estrutura do repositório · FND-02 contratos de dados · FND-03 runner de orquestração	Concluído
07–11/09	ING-01 cliente CKAN do Recife · ING-02 epidemiologia (dengue, chikungunya, zika) · análise de domínio	Concluído
14–22/09	ING-03 ocorrências da Defesa Civil · ING-04 ANA HidroWeb · ING-05 território (bairros e RPAs)	Concluído
23/09	**Marco: Fase 1 (Ingestão) fechada — issues, épicos e cards**	Marco
24–25/09	Auditoria geral da Fase 1: pontos fortes, fracos e 12 bugs levantados	Concluído
28/09–01/10	Correção dos 12 cards (BUG-01 a BUG-11 e QA-01): paginação completa, quarentena de linhas inválidas, datas, geometrias, amostras reais nos testes e CI no GitHub	Concluído
02/10	Revisão do cronograma	Concluído

O que falta — outubro a meados de novembro

SEM.	PERÍODO	ENTREGA	DEPENDE DE
S1	05–09/10	Bloqueante **Decisões de fonte:** substituto das ocorrências ("Atendimentos 2024"), credenciais e estações da ANA, fontes de áreas de risco e população	—
		INT-01 Calendário e padronização temporal	—
		INT-02 Referência territorial e georreferenciamento (inclui filtrar notificações de fora do Recife)	ING-05
S2	12–16/10	Ajuste da ING-03 ao novo esquema de ocorrências	Decisões da S1
		INT-03 Camada Silver — limpeza das tabelas de fato	INT-01, INT-02
S3	19–23/10	Caminho crítico **INT-04 Camada Gold — situação por distrito e dia**	INT-03
		IND-01 Indicadores meteo-hidrológicos (em paralelo)	INT-03
		IND-02 População exposta em áreas de risco (em paralelo)	INT-02
S4	26–30/10	IND-03 Motor de classificação de risco	IND-01, IND-02
		PNL-01 Painel com dados reais (KPIs e tabela de distritos)	INT-04, IND-03
	30/10	**Marco: Fase 2 fechada — primeira entrega visível ao cliente**	Marco
S5	03–06/11	PRD-01 Previsão de chuva e nível dos rios (02/11 é feriado)	INT-04
		PRD-02 Previsão de arboviroses	INT-04
S6	09–12/11	PRD-03 Motor de alertas preditivos	IND-03, PRD-01
		PNL-02 Gráficos de série e feed de alertas	PNL-01, PRD-03
		PNL-03 Boletim automático	INT-04, IND-03, PRD-03
	13/11	**Marco: entrega final (Fase 3) — apresentação e documentação**	Marco
Pós	após 13/11	Fase 4 — fontes complementares (APAC, INMET, CPRH, MonitorAr, DATASUS) e novos indicadores	—

Riscos e contingências

Decisões da S1 travam o resto
Sem a fonte nova de ocorrências e a ANA, a INT-03 sai incompleta. Contingência: seguir sem elas e plugar depois — os contratos de dados isolam a mudança.

INT-04 é o gargalo
Seis histórias dependem dela. Se atrasar, indicadores, predição e painel atrasam juntos. Prioridade máxima na S3.

S6 apertada
Três histórias em quatro dias úteis. Se for preciso cortar escopo, o PNL-03 (boletim automático) é o candidato natural a ficar para depois da entrega.
